

# 令和5年度（2023年度）公共事業再評価調書

(様式3)

基準年月日 令和5年8月1日

調書番号	08-27	所管部	建設部	作成責任者	土木局河川砂防課砂防災害担当課長 寺越 孝則
				担当係	砂防係(内) 29-401

## I 基本事項 (基準日時点)

事業種別	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)							
ふりがな 地区名	くしろちやうおしやまっほ 釧路町老若舞	市町村名	釧路町	総事業費	2,000 百万円			
負担割合	国	45.0%	道	55.0%	市町村	-	その他	-
	900 百万円		1,100 百万円		- 百万円	- 百万円		

事業目的・目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●土砂災害から地域住民の生命、財産、公共施設などを守るため、急傾斜地崩壊防止施設の整備を行う。</li> <li>●吹付法砕工、プレキャスト法砕工などの整備を行い、人家、町道などを土砂災害から守ることを目的とする。</li> </ul>
	<p>【アウトカム】 等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●土砂災害により被災するおそれのある家屋数 23戸 → 0戸</li> </ul>

事業概要	釧路町老若舞急傾斜地崩壊対策事業は、人家や公共施設などの保全対象を守るため、急傾斜地崩壊防止施設(吹付法砕工、プレキャスト法砕工)の整備を行うものである。	工事費内訳	【計画】吹付法砕工、プレキャスト法砕工	(百万円)	(百万円)	(百万円)
			吹付法砕工 L=280m (区間延長) A=13,430㎡ (施工面積)	555	1,745	1,190
			プレキャスト法砕工 L=110m (区間延長) A=1,341㎡ (施工面積)	60	60	0
			測量設計費 調査・設計	85	195	110
計			700	2,000	1,300	

総合計画での位置付け	総合計画の体系	大項目	中項目	小項目	施策名
		生活・安心	強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮	大規模自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服	大規模自然災害対策の推進(強靱化)

特定分野別計画等での位置づけ	施策目標・方針 【計画名：北海道強靱化計画 P26】 (砂防施設等の整備) 土石流危険渓流や急傾斜地崩壊危険箇所など土砂災害の恐れのある箇所について、近年の災害発生状況や保全対象などを勘案し、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設等の整備を推進する。
	関連する指標 土砂災害から保全される人家戸数 約2.5万戸(2018) → 約2.7万戸(2022)

## II 公共事業評価経過

(単位：百万円)

事業経過	事業採択	着手	評価年度	完了予定	経過年数	事業費	総事業費(a)	道負担額	当該年度事業費	累計事業費(b)	進捗率(b)/(a)					
							492	271								
事前評価又は当初	H25(2013)	H26(2014)		H29(2017)	10		2,000	1,100	47	619	31%					
前回再評価	H25(2013)	H26(2014)	H30(2018)	H35(2023)								700	385		371	53%
今回評価			R5(2023)	R13(2031)												

変更理由・内容(概要)	(1)岩盤掘削量が増となったことなどによる増額 (2)仮設計画変更による増額 (3)自然増による増額 (4)残事業の施工期間精査による事業期間の延伸
-------------	---

## III 事業採択前の状況

1. 事業採択に至る経過と背景	<ul style="list-style-type: none"> <li>●平成24年10月の台風に伴う豪雨により地区内において落石が発生し、斜面下部の落石防護柵工を破損した。</li> <li>●当該箇所は、昭和60~63年度にかけて斜面崩壊対策がなされてきたが、対策施設施工から25年以上経過し、その間の度重なる豪雨や融雪により経年的な斜面の脆弱化が進行し、斜面安定度が著しく低下している状況にある。</li> <li>●人家や町道などがあり、急傾斜地崩壊防止施設の整備が必要である。</li> </ul>
2. 事業検討の手続(住民への把握等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●H24年(2012年) 釧路町からの事業要望。</li> <li>●H25年(2013年) 釧路町老若舞急傾斜地崩壊対策事業に着手。</li> </ul>
3. 事業効果を及ぼす地域・対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>●釧路町仙鳳趾村老若舞地区 被害想定区域内における人家23戸、町道0.23km</li> </ul>

4. 関連する事業	事業名	事業主体	事業期間	事業費(百万円)	事業内容

#### IV 事業の実施状況

1.進捗状況	(1) 事業実績及び今後の計画																
	施工(工種)区分	工事内容	H25	H26	～	H30	R1	～	R5	R6	R7	～	R10	進捗状況	事業費(百万円)		
	吹付法砕工	L=280m				← L=123m →						← L=157m →		25%	1745		
	プレキャスト法砕工	L=110m				← L=37m →						← L=73m →		20%	60		
	測量設計費	調査・設計												62%	195		
(2) 進捗状況																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>吹付法砕工L=50m、プレキャスト法砕工L=49mの整備が完了。</li> <li>岩盤掘削量の変更や仮設計画の変更などにより事業期間を延伸しているが、残事業量を踏まえて事業期間の見直しを行っており、今後は順調に進捗していく見込みである。</li> </ul>																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">b</td> <td>a: 概ね予定どおり実施している。</td> <td>b: 事業計画・期間等を変更し実施する。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">c: 問題が生じ、実施に支障をきたしている。</td> </tr> </table>													b	a: 概ね予定どおり実施している。	b: 事業計画・期間等を変更し実施する。	c: 問題が生じ、実施に支障をきたしている。	
b	a: 概ね予定どおり実施している。	b: 事業計画・期間等を変更し実施する。															
	c: 問題が生じ、実施に支障をきたしている。																
	経済効果の内訳(百万円)		費用の内訳(百万円)		備考												
項目	R5現在	項目	R5現在	<ul style="list-style-type: none"> <li>「治水経済調査マニュアル(案)」(国土交通省R2年4月)「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)」(国土交通省R3年1月訂正)に基づき算出。</li> <li>効果は、がけ崩れ災害における直接被害額(家屋、公共施設、人的被害抑止効果等)及び間接被害額(営業停止被害抑止効果等)により年平均被害軽減期待額を算出。</li> <li>効果及び費用はR5に現在価値化し、「整備期間+完了後50年間」で算出。</li> <li>費用は、現在価値化及び50年間の維持管理費の計上により総事業費と異なる。</li> </ul>													
被害軽減効果	2,286	事業費	1,658														
		維持管理費	1														
合計(B)	2,286	合計(C)	1,659														
B/C	前回算定年度: H30年度(2018年度)【再評価時】			前回算定時B/C: 1.22(合計(B): 808 合計(C): 661)													
R5現在	変更理由																
1.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業費の増額に伴う費用の増加</li> <li>「治水経済調査マニュアル(案)」、「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)」の改訂に伴う便益算定方法の見直しによる効果の増加</li> </ul>																
3.コスト縮減などの取組	取組の項目		取組内容									縮減額(百万円)					
	施工方法の最適化		植生土のうの施工に当り、借地を行い機械施工を可能にしたことによるコスト縮減									1					
V 評価																	
1.必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>本事業は、釧路町老若舞の土砂災害被害を防止するためのものである。</li> <li>崩壊性の高い脆弱で不安定な土塊を有する急傾斜地であり、事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。</li> </ul>																
	a	a: 事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。 b: 着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。 c: 着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。															
		(1) 環境上の配慮及び課題															
<ul style="list-style-type: none"> <li>現況の露岩斜面の緑化を図るため、吹付法砕工の中詰材に植生土のうを用いることで、自然環境に配慮する。</li> </ul>																	
2.事業を推進する上での課題	(2) 事業推進に対する地域の動向・意向																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>釧路町及び地域住民から事業の早期完成に向けて毎年度要望が出されている。</li> </ul> ※前回の再評価以降における状況変化はない。																
	(3) その他の課題																
<ul style="list-style-type: none"> <li>特になし</li> </ul> ※前回の再評価以降における状況変化はない。																	
3.事業達成の見込み	前回評価から事業期間を5年延伸しているが、事業の必要性に変化はないほか、事業を推進する上での課題等もなく、前回評価から大幅に事業が進捗していることから、予定年度での事業達成が見込まれる。																
	a	a: 現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b: 課題はあるものの達成は可能である。 c: 大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。															
		現時点で想定可能な見直しを全て行っており、今後は順調な進捗が見込まれ、残りの事業期間内での事業達成が十分に可能なほか、B/Cは1.38となっていることから、令和13(2031)年度の完成を目指して事業を継続する。															
4.対処方針	a	a: 継続 b: 終了 c: 休止 d: 中止															
		事業期間変更の有無	有	事業内容変更の有無	無	総事業費変更の有無	有										

**VI 備考**

1. 評価履歴	【評価結果】 事前評価：該当なし 再評価：平成30年度評価 評価結果：継続（変更なし） B/C：1.22
	【特記事項】
2. その他の取組事項	

**補足資料**


**VII 事業計画変更**

(単位：百万円)

事業経過							経 過 年 数	事業費			
	再評価	事業採択	着手	評価年度	変更年度	完了予定		総事業費 (a)	当該年度事業費	累計事業費 (b)	進捗率 (b)/(a)
事前評価 又は当初		H25 (2013)	H26 (2014)			H29 (2017)	10	492			
変更①		H25 (2013)	H26 (2014)		H26 (2014)	H32 (2020)		619			
変更②					H29 (2017)	H35 (2023)		691			
変更③	1回目			H30 (2018)	H30 (2018)	H35 (2023)		700			
変更④					R4 (2022)	R13 (2031)		1,927			
変更⑤	2回目			R5 (2023)	R5 (2023)	R13 (2031)		2,000	47	619	31%
変更⑥											
変更⑦											
変更⑧											
変更⑨											
変更⑩											

<b>変更理由・内容</b>	<p>変更①：事業期間・総事業費の変更  <ul style="list-style-type: none"> <li>詳細な地形・地質調査の結果から、岩盤・土砂の掘削量を変更したことなどによる増額</li> <li>事業費の増額に伴い、残事業の施工期間を精査したことによる事業期間の延伸</li> </ul> </p> <p>変更②：事業期間・総事業費の変更  <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年9月の台風により斜面崩壊が生じ、対策工法を一部変更したことなどによる増額</li> <li>事業費の増額に伴い、残事業の施工期間を精査したことなどによる事業期間の延伸</li> </ul> </p> <p>変更③：総事業費の変更  <ul style="list-style-type: none"> <li>資材、労務単価の上昇による増額</li> </ul> </p> <p>変更④：事業期間・総事業費の変更  <ul style="list-style-type: none"> <li>施工実績の精査により、岩盤掘削量が増となったことなどによる増額</li> <li>地元協議の結果、施工計画見直しを行ったことなどによる増額</li> <li>残事業の施工期間を精査したことによる事業期間の延伸</li> </ul> </p> <p>変更⑤：総事業費の変更  <ul style="list-style-type: none"> <li>資材、労務単価等の上昇や消費税率の変更による事業費の増額</li> </ul> </p>
----------------	---

## 釧路町老若舞 急傾斜地崩壊対策事業費(社会資本整備総合交付金)

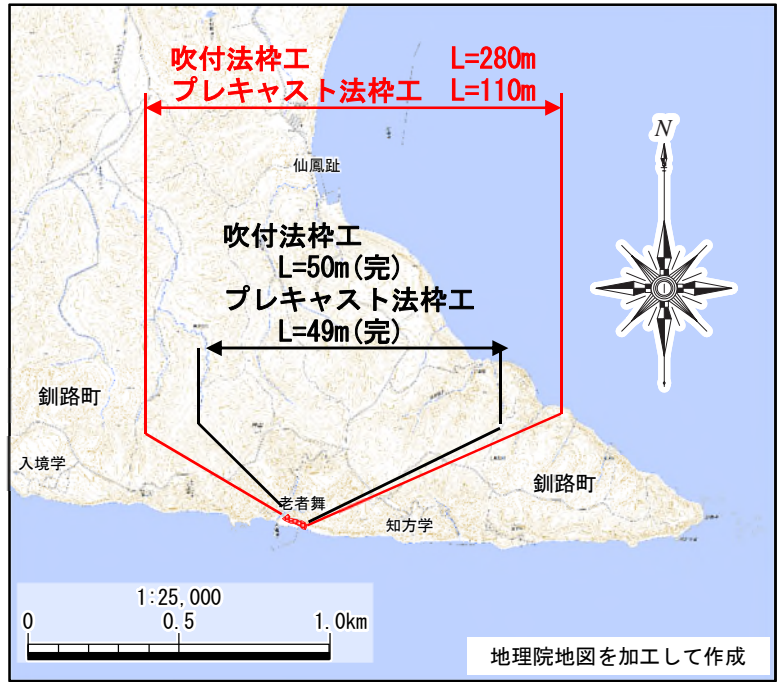

令和5年度時点施工状況

### 事業の目的

- 土砂災害から地域住民の生命、財産、公共施設などを守るため、急傾斜地崩壊防止施設の整備を行う。
- 吹付法砕工、プレキャスト法砕工の整備を行い、人家、町道などを土砂災害から守ることを目的とする。

### 事業概要

釧路町老若舞急傾斜地崩壊対策事業は、人家や公共施設などの保全対象を守るため、急傾斜地崩壊防止施設(吹付法砕工、プレキャスト法砕工)の整備を行うものである。

